



项目管理理论与实践

一、概述

传统项目管理 → 现代项目管理

如何完成一个研究课题?

① 确定研究方向, 分析可行性, 需要什么人

② 制定研究计划, 确定资源

③ 开展课题研究, 数据分析、整理, 与大家共享解决问题


④ 撰写报告和论文总结成果, 评估发表...

项目管理定义: 将知识、技能、工具与技术应用于项目活动, 以满足项目需求。

~~项目~~五大特性: 目标性

项目管理三要素: 时间、成本、质量

成本

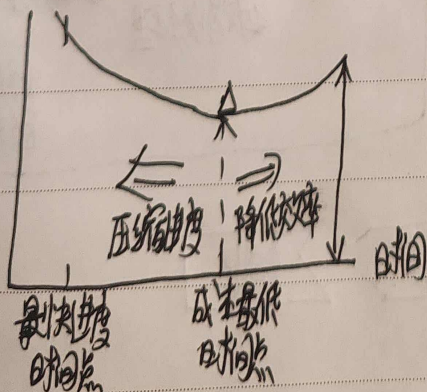

高阶目标:

实现组织(企业)战略目标


项目团队成员满意

项目相关方满意


痛点：北宗罪：拖延、推诿扯皮、沟通困难、协作效率低、任务繁重、重陷覆

项目管理五大过程：

启动→规划→执行→^{监控过程}监控→收尾



(项目生命周期)

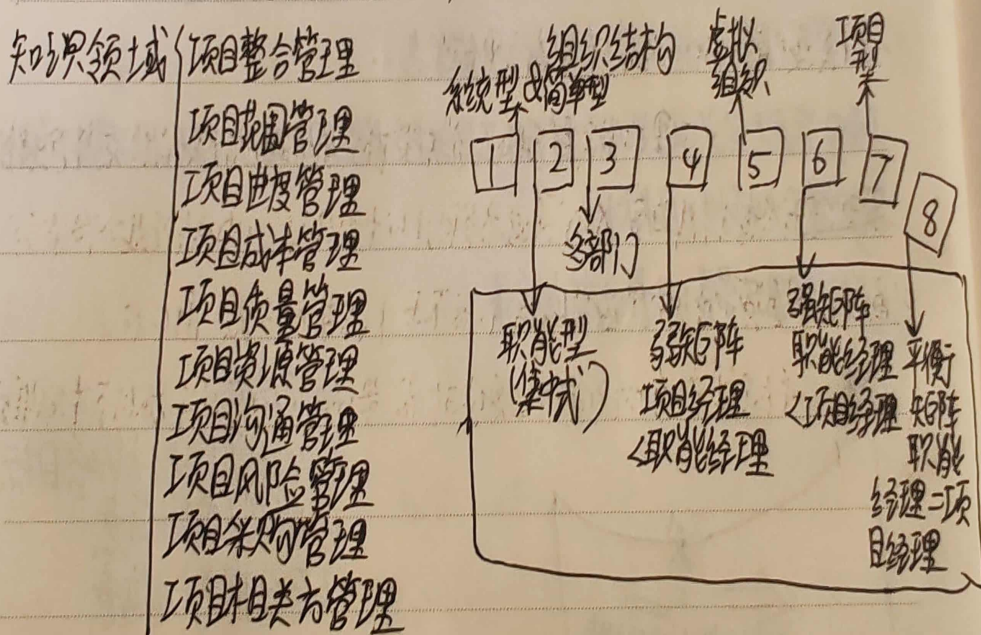


过程逻辑：输入 → 工具与技术 → 输出

组织结构对项目影响：

职能型组织结构：资源集中、晋升清晰但项目聚焦弱。

Memo No. Page 3
Date 7/28/2026



项目型: 责任明确、决策快, 资源占用易浪费, 项目结束后人员无保障。

矩阵型: 兼顾两者优势, 能充分调配资源, 和保持政策一致性, 但核心缺陷是员工同时向职能经理和项目经理双线汇报, 违背命令单一性原则。

二、核心内容总结

1. 组织结构光谱: 从职能型 → 弱矩阵 → 平衡矩阵 → 强矩阵 → 项目型, 是一条线性光谱。项目经理权限, 角色称谓 (联络员 → 协调员 → 项目经理 → 总指挥官) 和资源控制权 随右移递增; 弱矩阵中项目经理优先级更高, 弱矩阵中职能经理主导。

2. 十大知识领域: 整合管理 (核心), 范围管理 强调 "做且只做", 成本管理聚焦建设路径法, 成本管理区分管理储备与应急储备, 质量管理遵循 PDCA 循环, 沟通管理讲究 "四个正确" (正确形式、时间、受众、影响)。

3. 敏捷项目管理: 针对传统项目交付周期长、质量差、沟通失真等问题, 每构建以 1-4 周迭代快速交付运行软件, 核心能力为 Scrum 四仪式——迭代规划、每日站会、迭代复盘、迭代回顾, 倡导自组织团队和可持续开发节奏。

4. 项目经理能力模型 (PMI 三角): 技术项目管理 + 领导力 + 战略商务管理, 核心法则是 "在领导面前当专家, 在专家面前当领导", 职业路径可向产品经理、技术管理、部门主管等多方向延展。

Memo No. Page 4
Date 7/28/2026



5. 思特奇项目管理实践：公司项目管理始于1995年，经历从单纯进度管控到全生命周期体系演进，项目分为P类(售前)、研发类、X类(工程新建)、D类(新需求)、Y类(运维)，强调项目策划与章程规范性。

三、个人经验分享——老师点评

1. 团队管理建议：组长不要过于独自承担所有问题缺乏沟通，应将团队问题可视化、透明化，与成员共同提出问题、达成共识、协同执行，避免“一个人苦思冥想却无人理解”的局面。

2. 做得好的点：①主动将学术成果转化为企业可落地、可量化的业务价值，体现了“交付的是价值而非交付物”的项目管理的理念；

②在与企业沟通中，已潜移默化地将企业方纳入项目体系进行管理。

3. 改进方向：团队成员不懂技术并不参与，应明确每个人的角色与分工，通过团队对齐目标来保证配合质量，而非独自包揽所有技术工作。
